

预算编审答疑

项目名称：万州经开区基础设施及配套用房完善工程之 M8 地块标准厂房附属设施修复工程

一、图纸方面

1、细砂土回填，采用细砂还是土？

回复：原土回填

2、本项目的混凝土采用商品砼还是自拌砼；

回复：商品砼



3、土石方开挖的方式采用人工还是机械？

回复：机械

4、请明确本项目有哪些材料属于甲供材；

回复：无甲供材

5、路面恢复的做法采用哪一个；

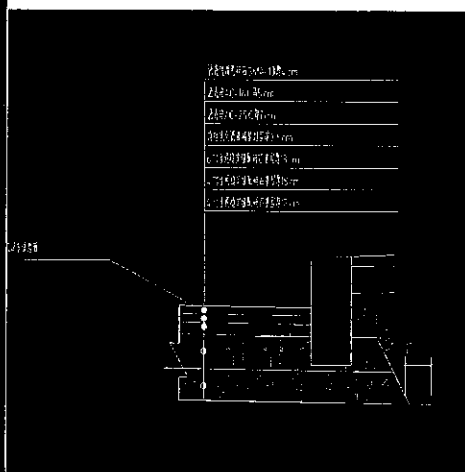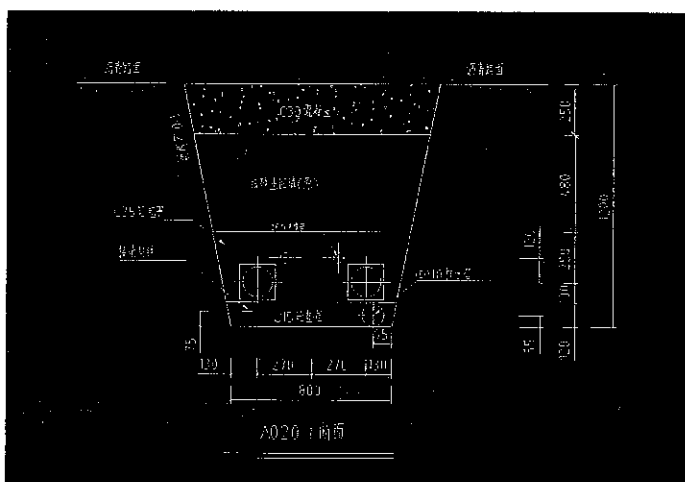

回复：详见路面（地面）施工大样图。

二、现场组织方面

1、土石比例请明确；

回复：暂按 8：2 考虑。

2、余方弃置的运距按多少计算，存在弃渣费吗？存在按多少元/m³ 计算？

回复：弃渣费 25 元/方，运距 5km。

三、预算方面

预算答疑中介签字确认栏

设计单位	预算编制单位	预算审核单位
单位名称：	单位名称：	单位名称：
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

预算答疑内部签字确认栏

三投司计划发展部	三投司公建部	三投司工程部
----------	--------	--------

经办人: 向爽 部 长: 白强 分管副总: 谭磊	经办人: 部 长: 分管副总	经办人: 部 长: 分管副总
规划发展部	建设管理部	
经办人: 部 长:	经办人: 部 长:	

复核说明:

- (1) 图纸方面、现场组织方面由三投司复核;
- (2) 预算金额是否超批复金额由规划发展部复核;
- (3) 预算方面由建设管理部复核。
